


DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
---------	------	----------	------------

0	A	REALIZZAZIONE ROTATORIA	0
1	B	Installazione cantiere	1
2	C	Demolizioni e rimozioni	4
3	D	Formazione rilevato stradale	5
4	E	Scavi posa tubazioni e fondazioni varie	20
5	F	Posa tubazioni PVC e corrugati imp. Illuminazione	4
6	G	Posa in opera cigli	8
7	H	Realizzazione sottofondi marciapiedi e banchine a raso	10
8	I	Posa in opera pozzetti e griglie	10
9	L	Posa in opera impianto elettrico e pali illuminazione	9
10	M	Installazione segnaletica verticale	1
11	N	Fresatura	2
12	O	Posa in opera fondazione stradale	8
13	P	Posa in opera strato di base	2
14	Q	Posa in opera strato di binder	2
15	R	Posa in opera strato di usura	2
17	T	Rifacimento segnaletica orizzontale	1
19	V	Smobilizzo cantiere	1

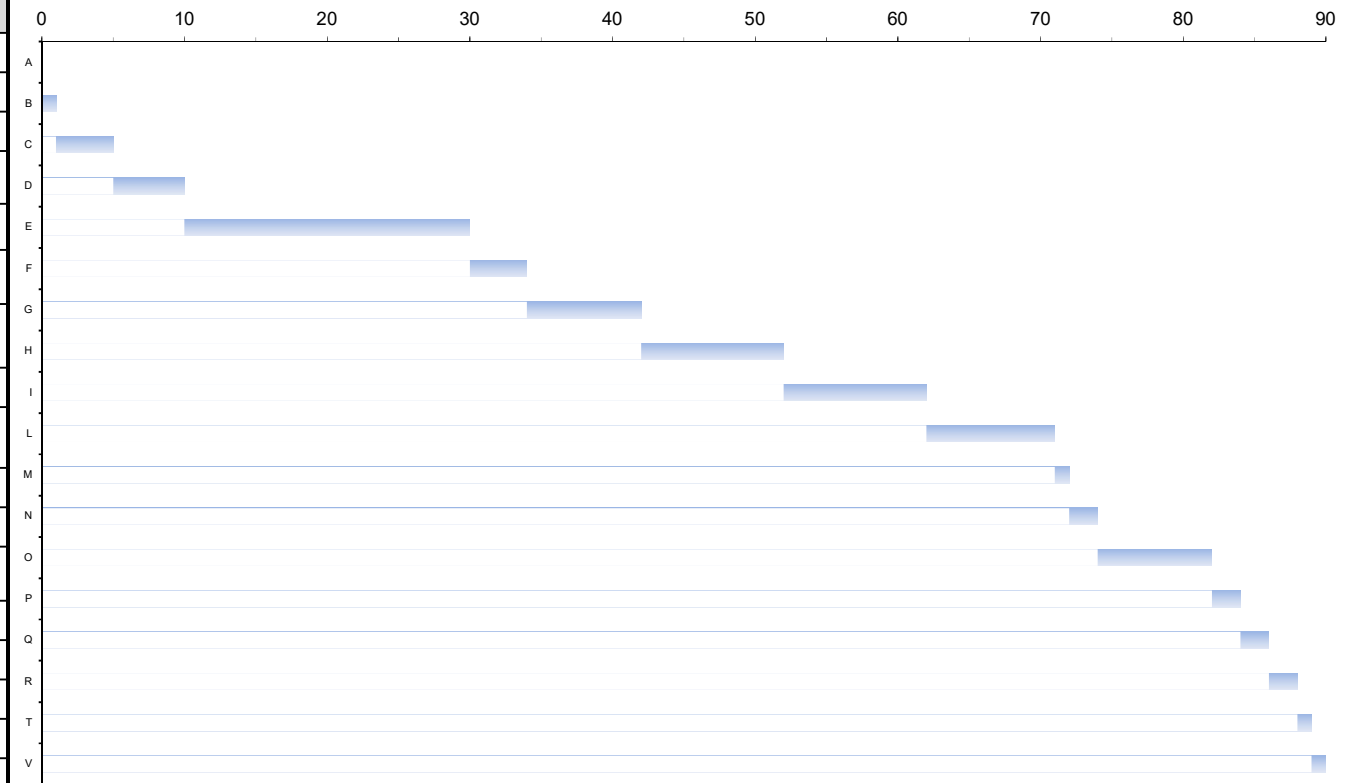

Inizio lavori

Fine lavori

0 gg

90 gg

TC

90

naturali consecutivi
