



COMUNE DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA SAN MARTINO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA : ARCH. DAMIANO MAURIZIO SOLLAMI
GEOM. ORESTE SPADARO
GEOM. ALESSANDRO LELLO
ARCH. APPOLLONI DANIELA
AMM. ILARIA GERMANI


SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE VELLETRI SERVIZI S.P.A. :
ARCH. AGOSTINO LAZZARI
GEOM. PIER LUIGI CONCIATORI

DICEMBRE 2020

Manutenzione straordinaria scalinata San Martno "Cronoprogramma dei lavori"

DURATA 90 GIORNI (12,85 SETTIMANE)

Cantiere	Attività	Fasi	Durata giorni
1	ALLESTIMENTO CANTIERE 1	1	1
1	DEMOLIZIONE SCALINATA	2	2
1	REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE METEORICHE SCALINATA	3	3
1	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALINATA	4	5
1	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN SELCE SCALINATA	5	20
1	POSA IN OPERA DI CORRIMANO SCALINATA	6	1
1	SMOBILIZZO CANTIERE 1, ALLESTIMENTO CANTIERE 2	7	1
2	SMONTAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE SELCIATA STRADA	8	10
2	REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE METEORICHE STRADA	9	6
2	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN SELCE STRADA	10	40
2	SMOBILIZZO CANTIERE 2	11	1

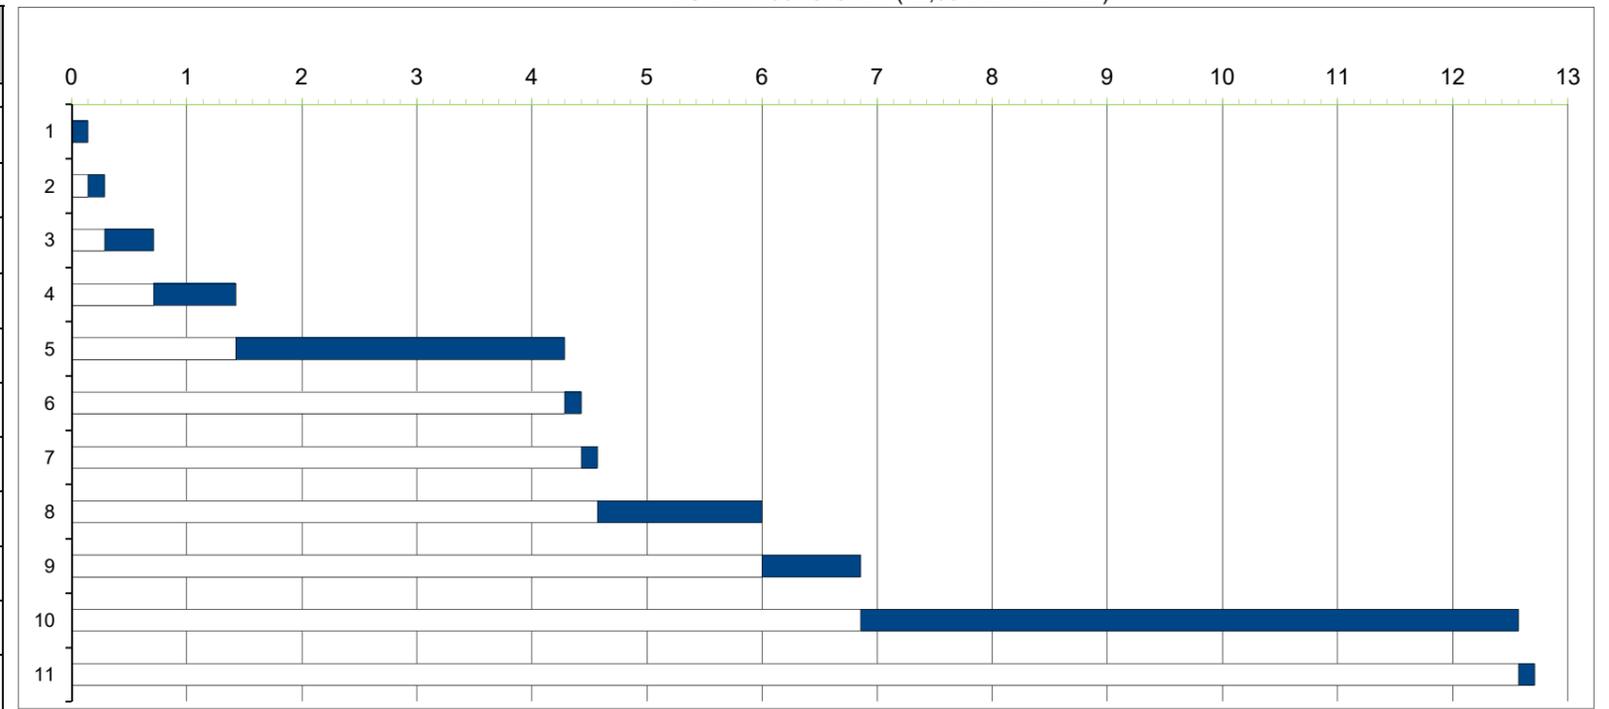

Durata lavori in giorni naturali consecutivi

90

